



**TIERPARK
COTTBUS**

Eigenbetrieb Tierpark Cottbus

**ausgewählte Aspekte für den Ausschuss
Wirtschaft, Beteiligungen und
Strukturwandel
am 14.10.2021:
Coronapandemie
Elefantenhaus
Raubtierhaus 2. BA**

Coronapandemie (2021): Probleme



- Viel Verunsicherung:
 - Schließzeiten
 - Testpflicht
 - Maskenpflicht
 - Maskenpflicht in Häusern
 - Dadurch: Besucherrückgang
- Erheblicher Mehraufwand Personal Kasse, Einlaß
- Einschränkungen Gastronomie
- Problem Zooschule – Abrechnung INTERREG-Mittel
- Fehlende gemeinsame Mittagspause...
- ...



Coronapandemie (2021)

...aber:




- Keine gravierenden Probleme Ausfall Mitarbeiter (Erkrankungen, Quarantänisierungen)
- Gute Zusammenarbeit mit Behörden
- Verhältnismäßig geringe Einschränkungen für Tiergärten in Brandenburg




**TIERPARK
COTTBUS**


Besucherzahlen

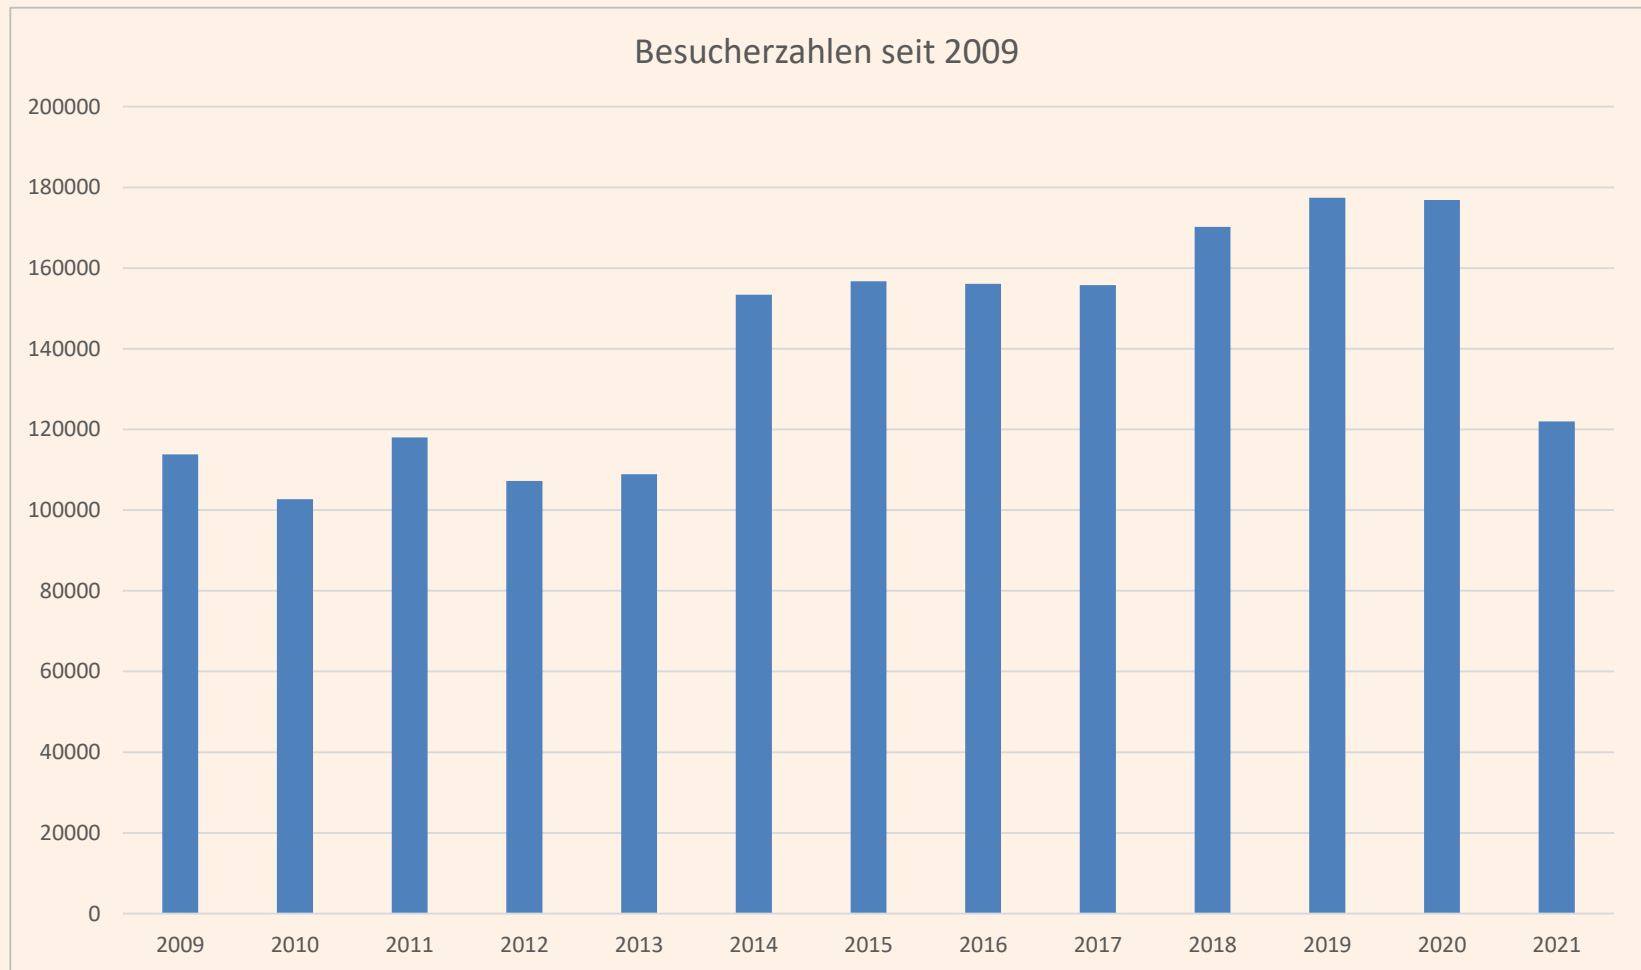

Coronapandemie: Besucherzahlen

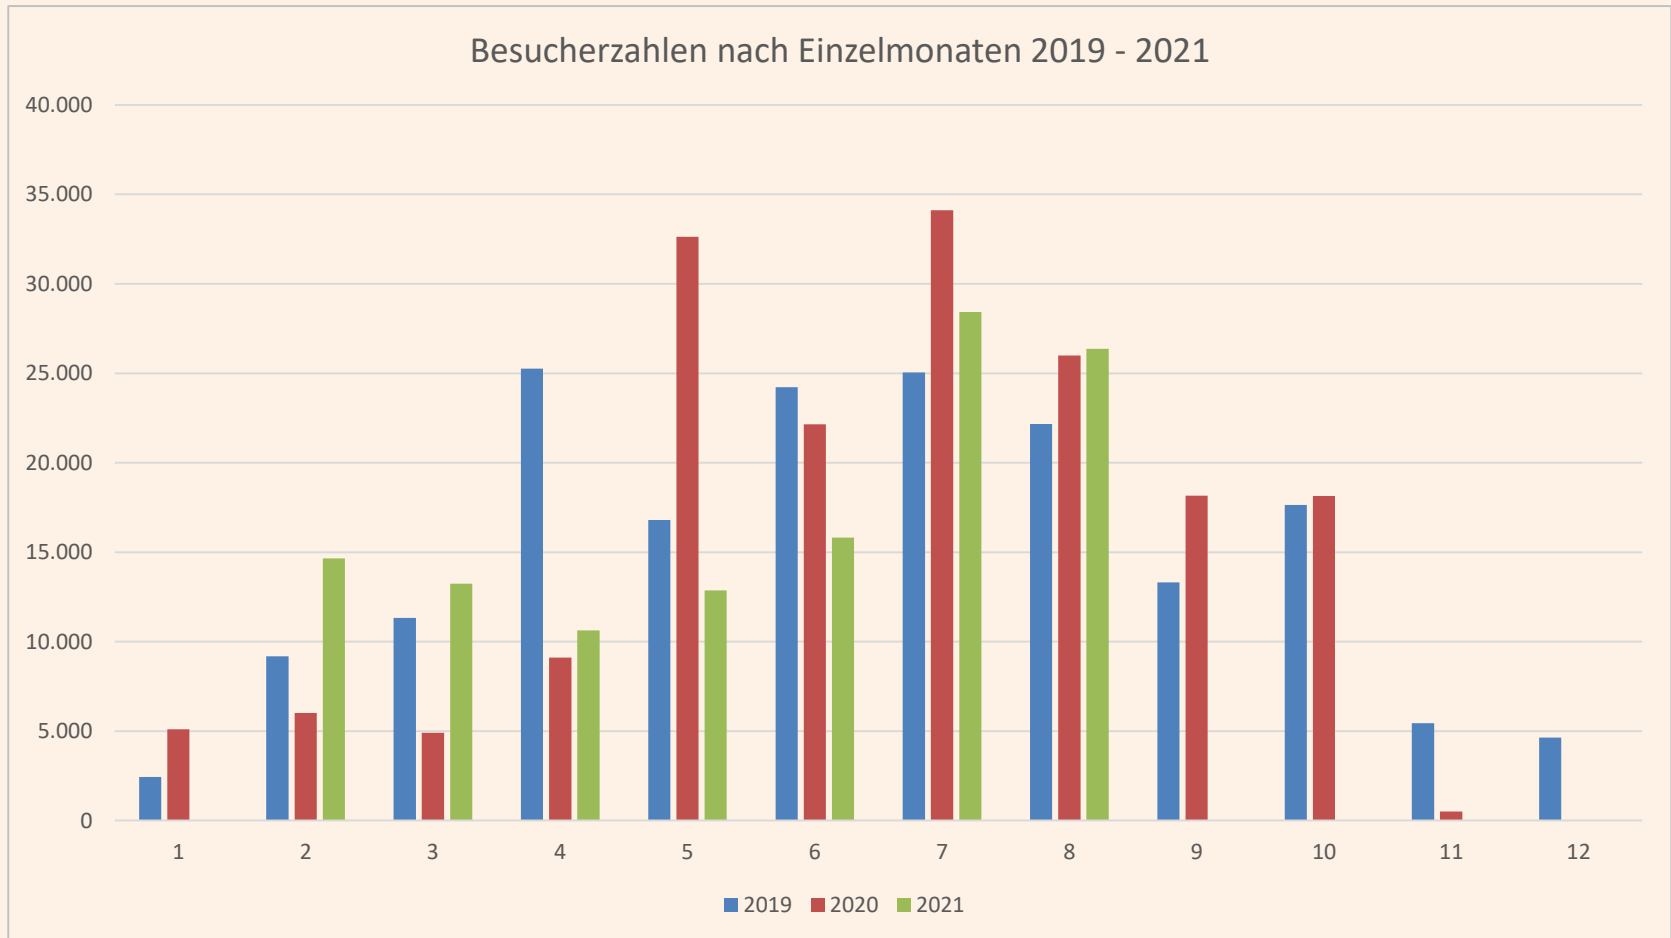

Coronapandemie: Besucherzahlen II

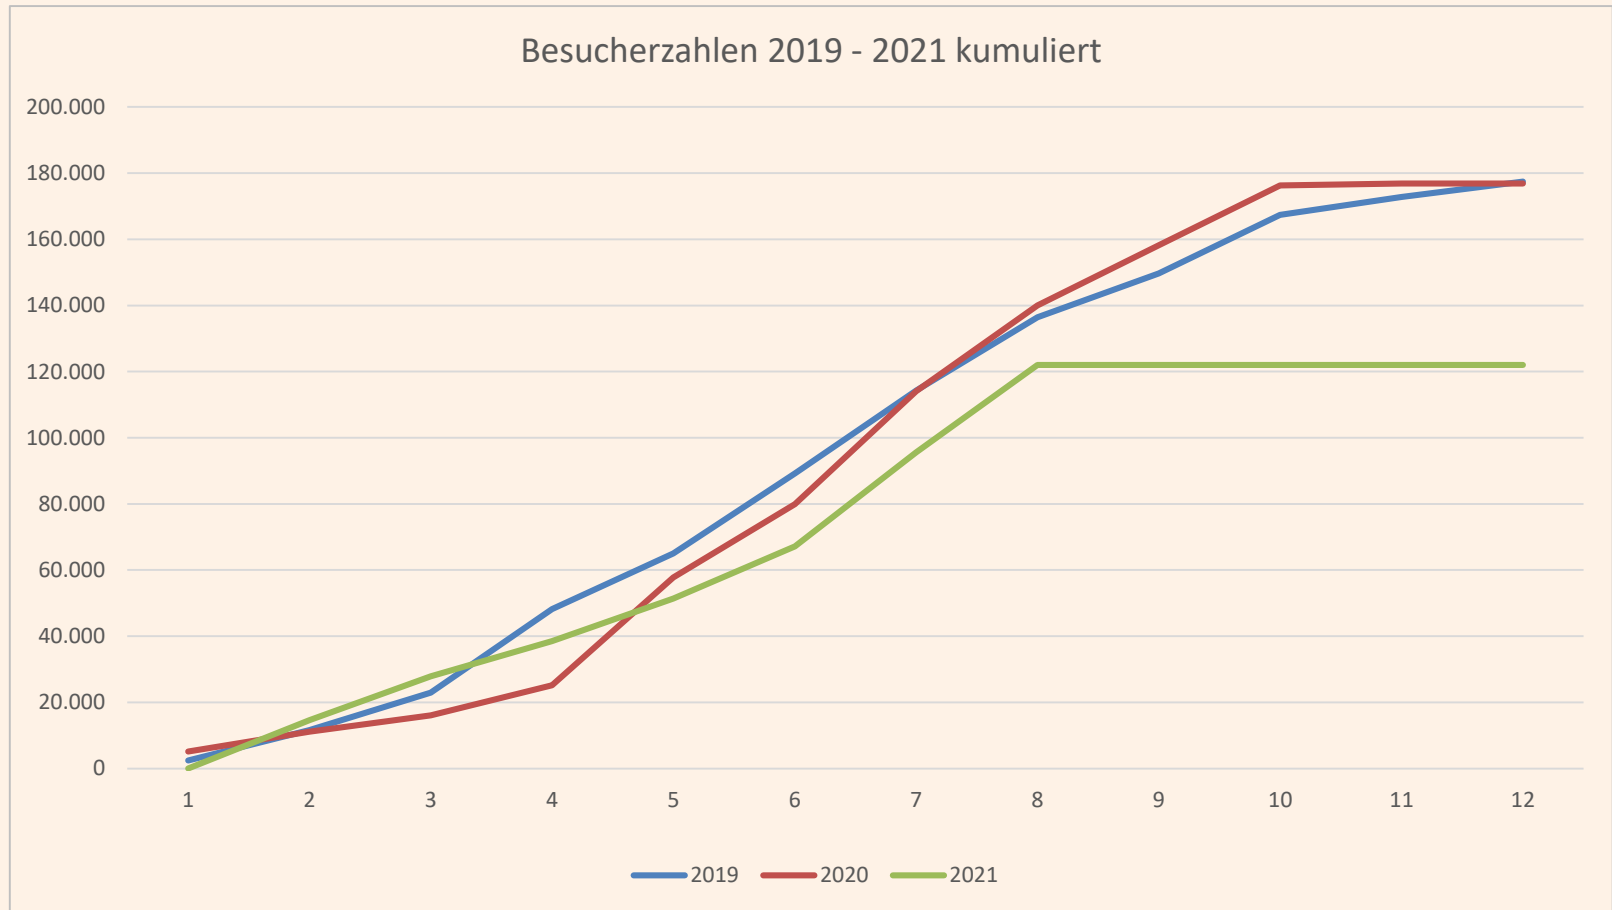

Übersicht



	2020	2021
Umsatzerlöse Aug/2021	148.838,02 €	156.465,11 €
Veränderung		+ 5,12
Kumuliert Jan – Aug 2021	871.731,41 €	767.779,70 €
Veränderung		- 11,92 %
Schließzeiten	Ostern 02.11. – 31.12.20	01.01. – 14.02.21 Frühjahr

Pandemie: Schlußfolgerungen



- Besucherrückgang in 2021
- Gute, aber wohl nicht vollständige Kompensation
- Als kommunaler Eigenbetrieb keine existenzielle Not



**TIERPARK
COTTBUS**

Elefantenhaus

- Wichtigstes Infrastrukturprojekt
- Projektstart/Planungsbeginn 2018
- Baustart Februar 2021
- Fertigstellung: 1. Jahreshälfte 2022
- Gesamtkosten: 2,4 Mill. €






**TIERPARK
COTTBUS**

Elefantenhaus

Rohbau einschließlich Dachkonstruktion und –hülle	In Kostenrahmen abgeschlossen*	Fertig Okt./Nov. 2021
Heizung	Ausschreibung in Kostenrahmen abgeschlossen	
Sanitär	dto.	
Elektro	dto.	
Estrich/Fliesen	dto.	
Metallbau Fenster, Türen	dto.	
Metallbau Elefanten (Tore, Schieber, Gitter)	Endredaktion Ausschreibung Aktualisierte Kostenrechnung	

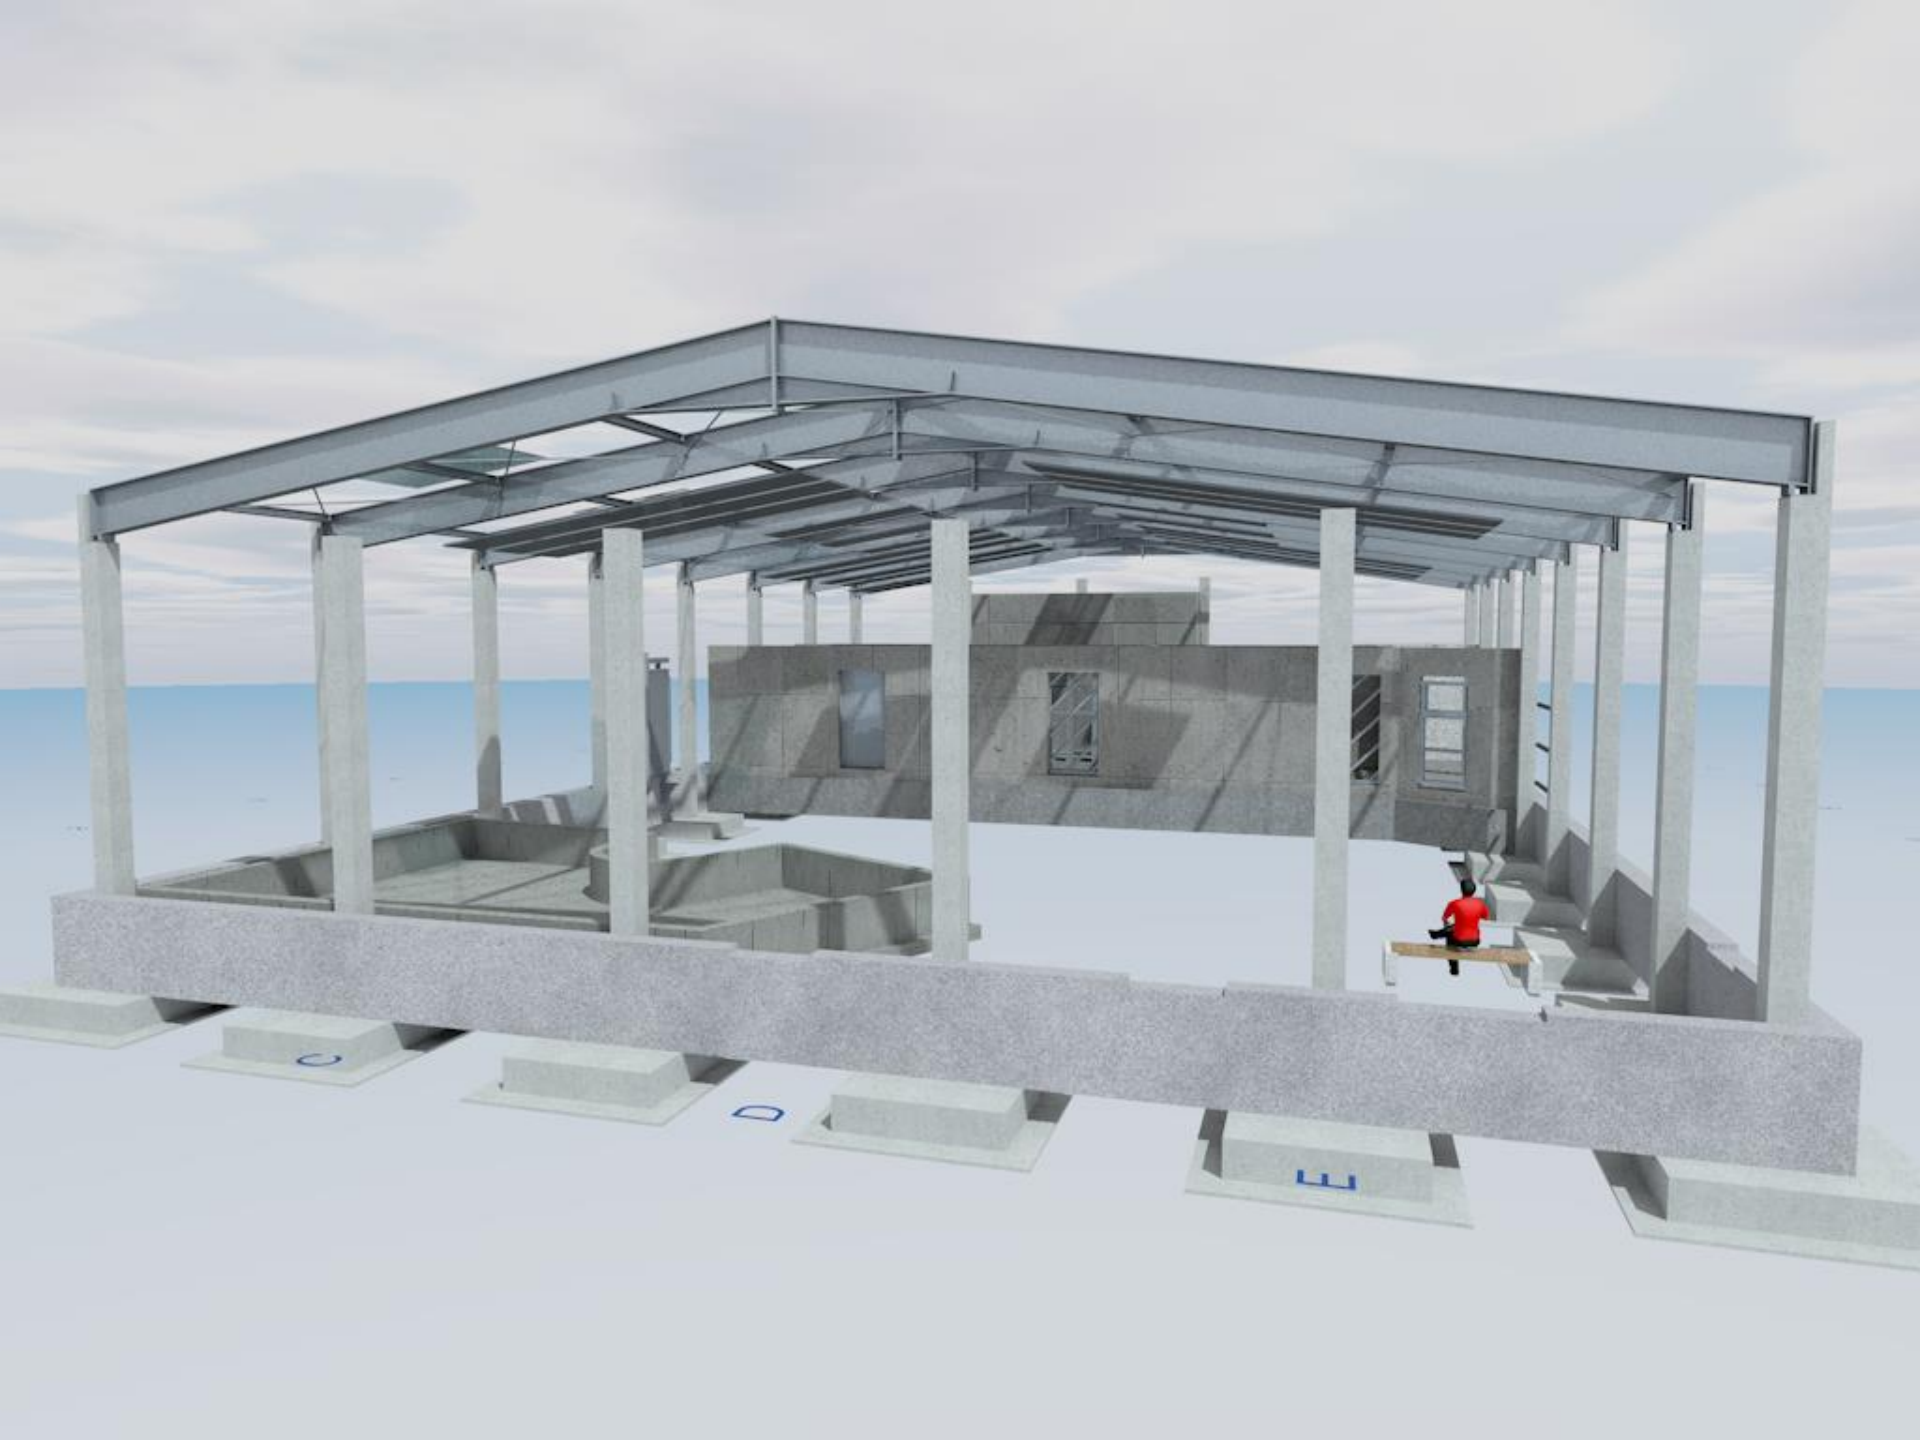















**TIERPARK
COTTBUS**

Ausblick...






**TIERPARK
COTTBUS**

Raubtierhaus 2. BA

- Planungen und Vorbereitung Förderantrag INTERREG seit 2016 (1,85 Mill. €)
- Mehrfach veränderter Förderantrag
- Zuwendungsvertrag Juli 2020 (1,2 Mill. €, davon 397 T€ Fördermittel)
- Baustart August 2021
- Rohbau fertig bis Dezember 2021
- Fertigstellung (+ Abrechnung) 2022




TIERPARK COTTBUS

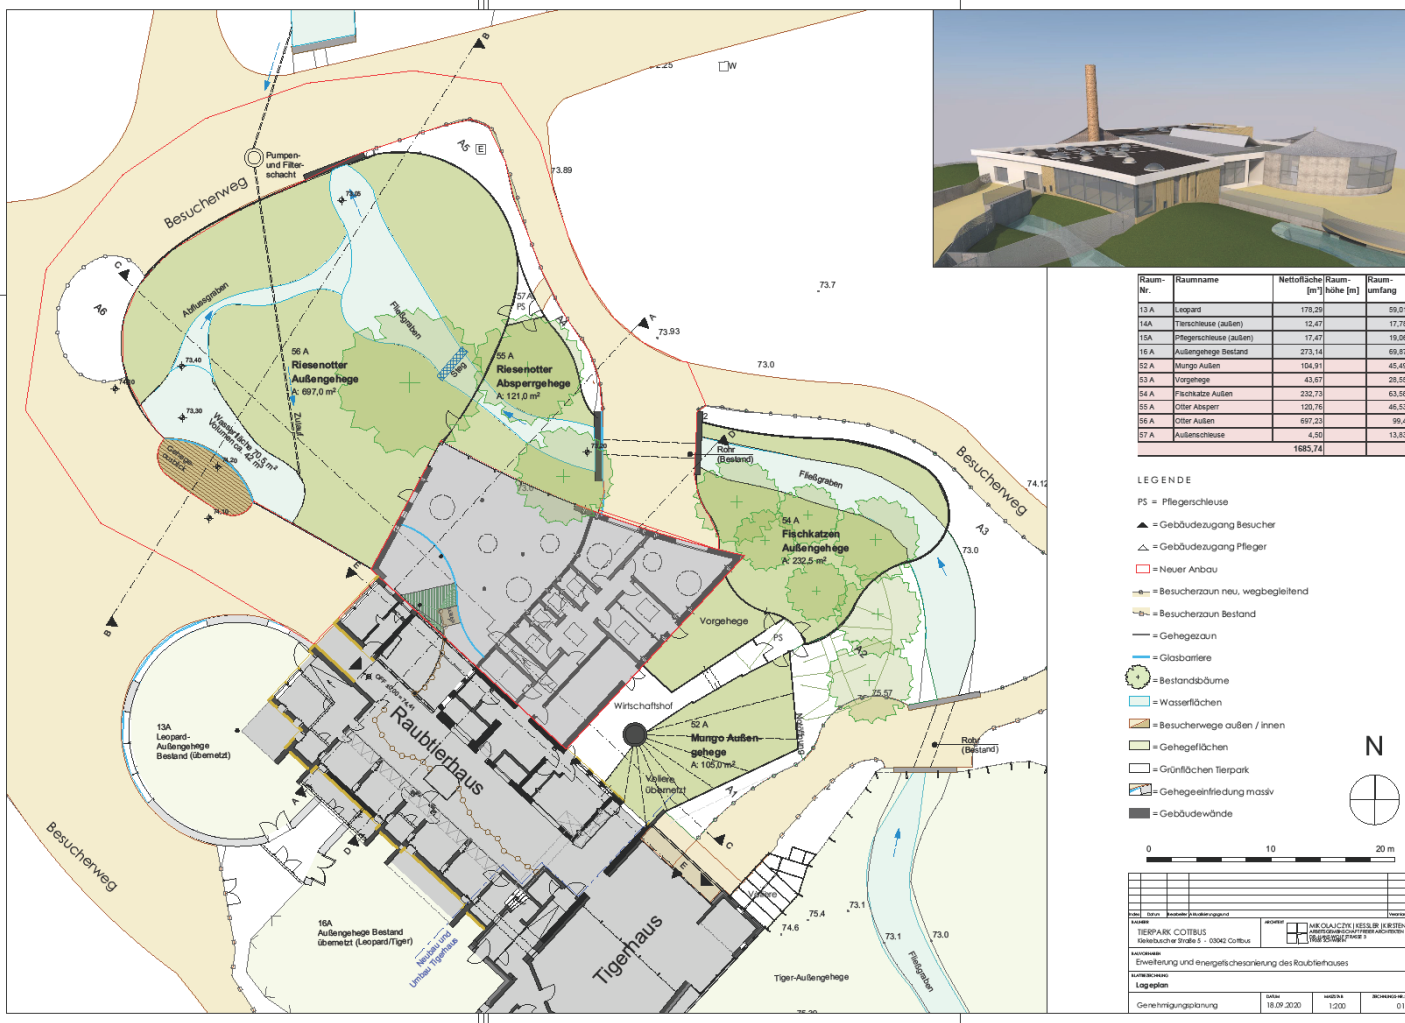





TIERPARK COTTBUS

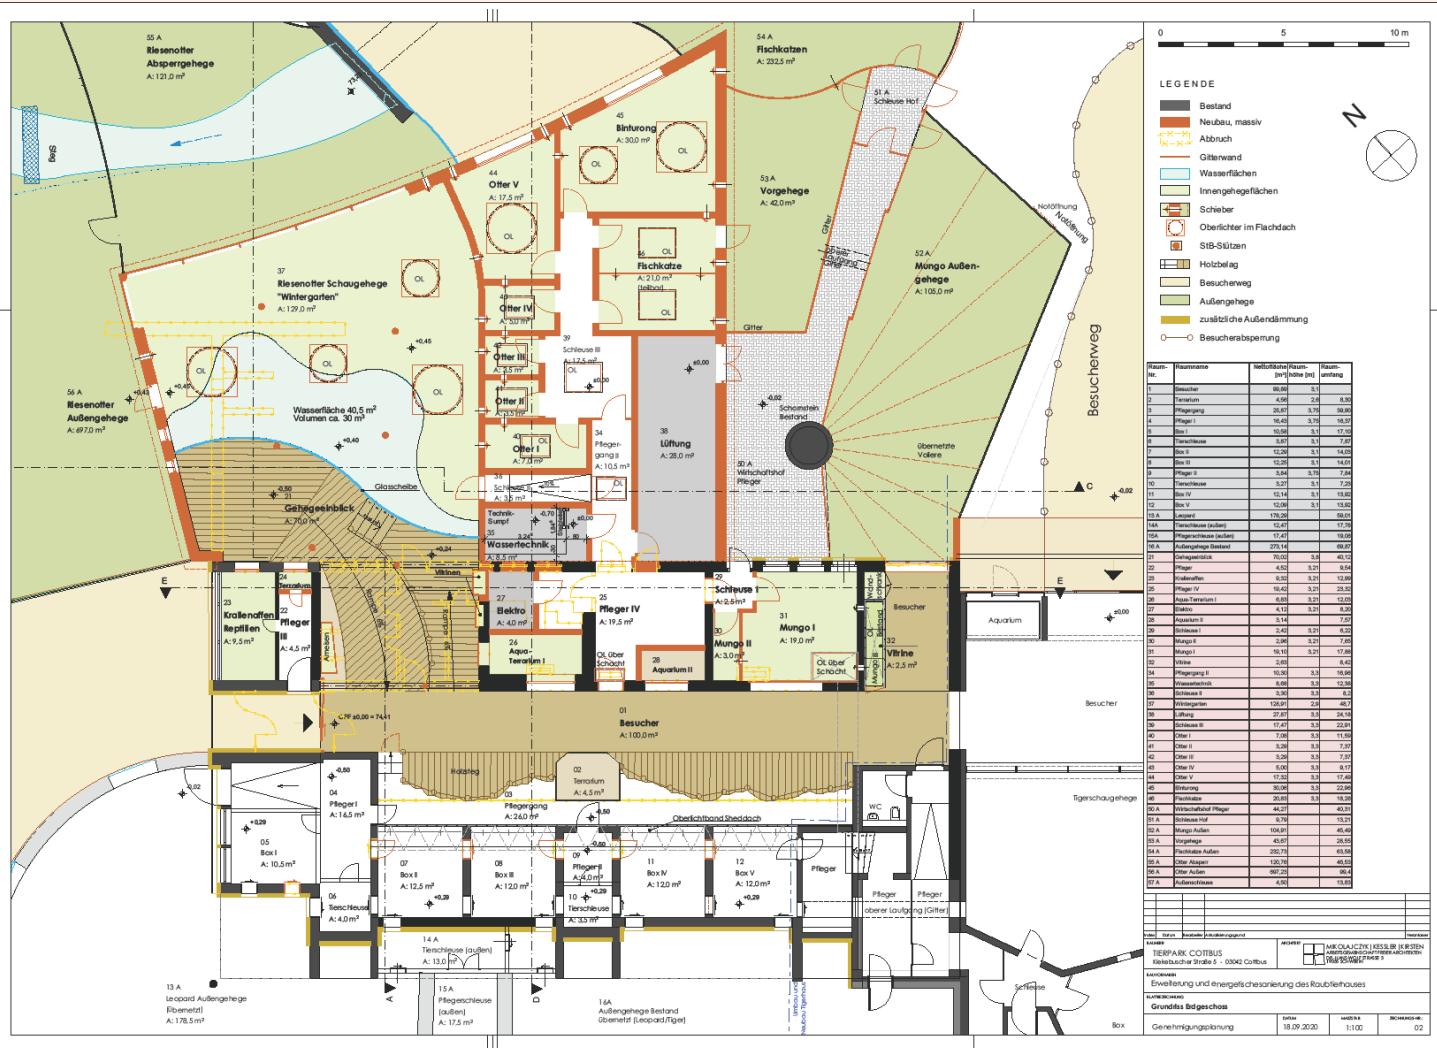

NORDEN

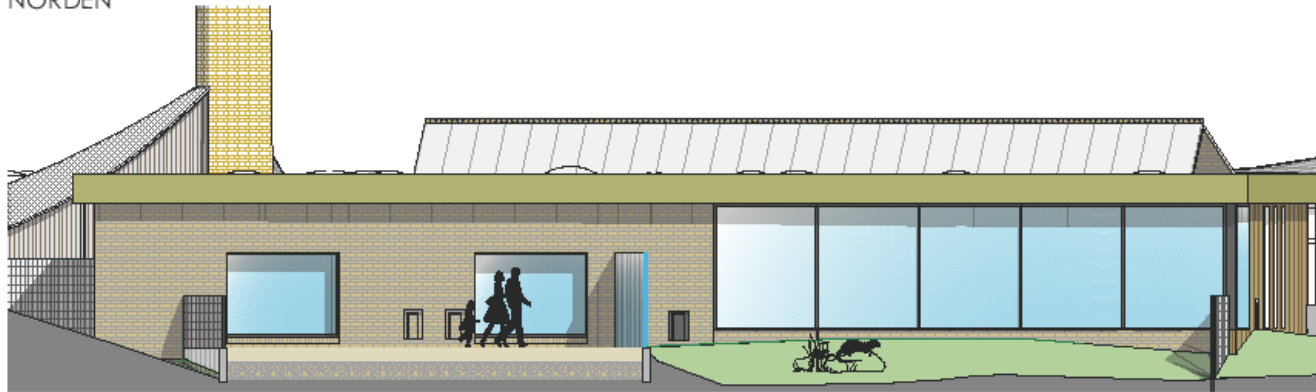

OSTEN

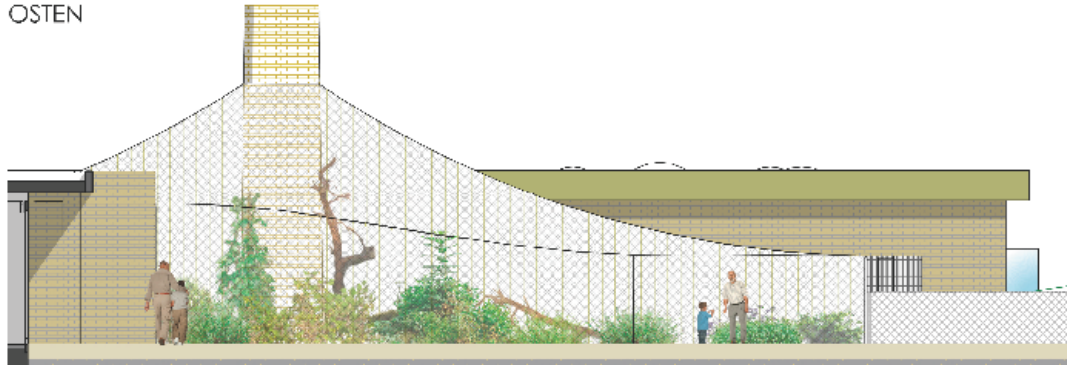

Westen



Index	Druck	Bestandteile	Anzahl Blätter/Grund					Verzeichnis	
BAUBEREIT			ARCHITEKT						
TIERPARK COTTBUS Klebebuscher Straße 5 - 03042 Cottbus			 MIKOŁAJCZYK KESSLER KIRSTEN ARCHITECTEN GEWERKSCHAFT TIERPARK DR. JENS WOLFF PR. AISE 3 17005 SCHWEN						
BAUVORNAME									
Erweiterung und energetische Sanierung des Raubtierhauses									
BLATTBEZEICHNUNG									
Ansichten									
Genehmigungsplanung		DATEI	18.09.2020	MASSSTAB	1:100	ZEICHNUNG NR.			
								04	

















**TIERPARK
COTTBUS**





**TIERPARK
COTTBUS**

