




Beratung des Ausschusses für Bau und Verkehr

Ralf Thalmann, Geschäftsführer Cottbusverkehr GmbH

Baustelle Straße der Jugend aktueller Bautenstand


- Fräsarbeiten zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Brandenburger Platz
- Gleisneubau geplant ab KW 3/2023: Dauer ca. 4 Wochen
- anschließend Fräsarbeiten und Erneuerung Asphaltdeckschicht zwischen Rudolf-Breitscheid-Straße und Bürgerstraße

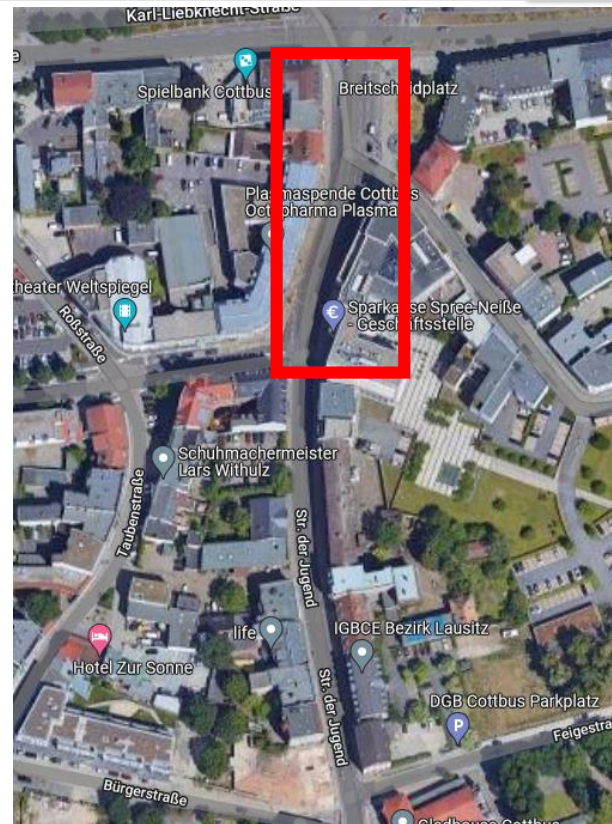

Baustelle Straße der Jugend

Nachträge/ Abweichungen von ursprünglicher Planung

- zusätzliche/ neue Leistungen: Gleise, Befestigungssystem, Bauleitung Gleisbau, Gleisrückbau, Änderung Deckenschluss, Erneuerung Entwässerungsanschluss
- Ursache: durch bauablaufbedingte durchgehende Sperrung Entscheidung für Einbau neuer Gleise → führt nicht zu einer Verzögerung der Gesamtmaßnahme

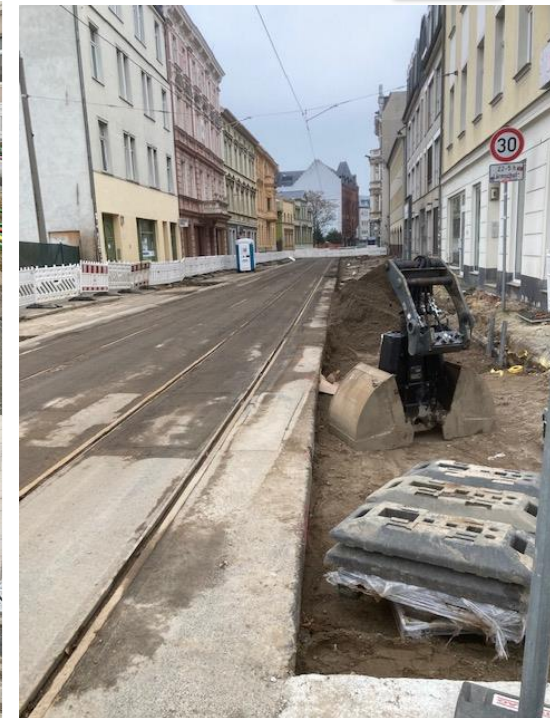



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ralf Thalmann

Geschäftsführer Cottbusverkehr GmbH
